

## **POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE COOPERATION INTERNATIONALE**

**ASSOCIATION HORIZON 54**  
**10, rue François-Evrard 54140 Jarville-la-Malgrange**

**SOUTIEN DU CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE SABALIBOUGOU**  
**District de BAMAKO - République du MALI**

### **COMPTE-RENDU DU PROJET**



**Corvée d'eau à Sabalibougou**

La création des CSCOM (centres de santé communautaires) dans le quartier de Sabalibougou a été très appréciée des habitants qui étaient obligés de se rendre dans les grands hôpitaux de Bamako pour y faire leurs consultations, ce qui posait d'énormes problèmes d'accessibilité compte-tenu de leurs revenus très faibles. Ce sont des associations d'habitants (associations de santé communautaires) qui assurent la gestion des CSCOM. Le quartier de Sabalibougou regroupe 25 % de la Commune V du District de Bamako, soit 62 728 habitants. Il y a trois CSCOM sur le quartier parrainés par l'association HORIZON 54.

Le CSCOM 3, dernier né des centres de santé communautaires, a été construit sur un terrain très difficile d'accès, proche des habitations en banco, à proximité d'un dépôt d'ordures. Depuis son ouverture, les responsables ont été confrontés à l'absence de clôture ne garantissant pas la confidentialité des accouchements, et surtout, à l'absence d'adduction d'eau. Les bénévoles d'HORIZON 54 ont participé à plusieurs réunions avec les membres du Conseil d'Administration de l'ASACO (association de santé communautaire) afin de rechercher les moyens de rendre plus attrayant l'établissement et surtout de garantir une meilleure hygiène aux patients et au personnel.

L'équipe de responsables et le médecin ont réfléchi, avec les délégués d'HORIZON 54, aux moyens de financer les travaux.

Aucune action d'HORIZON 54 n'étant réalisée sans réciprocité, il a été décidé que l'ASACO se chargerait de faire faire les devis, de demander une subvention à la Commune V et ferait participer les jeunes du quartier au chantier. Une déclaration d'adhésion à un projet d'initiative de base, signée par les parties et approuvée par le maire de la commune et par le chef de quartier, a été rédigée, ainsi qu'une convention pour la mise en œuvre d'une action de partenariat définissant les obligations de chacun.



Réunion avec les membres de l'ASACO

## Modifications apportées au calendrier prévisionnel

Nous avons programmé les actions sur 8 mois, entre Février et Septembre 2009. Les bénévoles d'HORIZON 54 se sont rendus au Mali en Février et Octobre 2009 et ont constaté qu'il faudrait quelques mois supplémentaires pour terminer le chantier. Lors de leur dernière mission, en Février 2010, ils ont pu faire le bilan de l'action avec les responsables du CSCOM, les représentants d'HORIZON 54 à Bamako et rencontrer le Maire de la Commune.



Le mur, au début



à l'arrière, le mur presque terminé

## Actions réalisées par rapport aux actions prévues

- \* adduction de l'eau : terminée
- \* mur d'enceinte : travaux d'élévation terminés, reste à poser les portes et le crépis
- \* plomberie : en cours de finition


## Résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux

Le chantier s'est déroulé en 2 temps : 10 jours consécutifs en Février 2009 pour le creusement de la canalisation par 10 jeunes du quartier (avec l'aide d'Américo MARTINS et d'un chef de chantier malien désigné par Energie du Mali) et, par la suite, 2 jours chaque semaine pour terminer le mur d'enceinte (sous la responsabilité d'une entreprise locale et le suivi d'un de nos représentants au Mali, actuellement salarié, Modibo BAGAGA).

Les jeunes participants au chantier de Février , au nombre de 10, sont engagés dans une association de jeunes musulmans. Ils s'investissent régulièrement sur le quartier en participant au nettoyage des CSCOM et des abords. Ils sont très motivés. Nous leur avons fourni le petit matériel

nécessaire (pelles et pioches) et remis chaque jour 1 000 FCFA, correspondant à ce qu'ils gagneraient pour d'autres travaux équivalents. Le travail commençait à 7 H 30 pour se terminer entre 12 H 30 et 13 H. Les responsables du CSCOM ont fournis le repas de midi.

Par ailleurs, ces mêmes jeunes se sont remplacés pour assurer chaque jour (hors chantier) l'arrosage du mur pour éviter le séchage trop rapide du ciment.

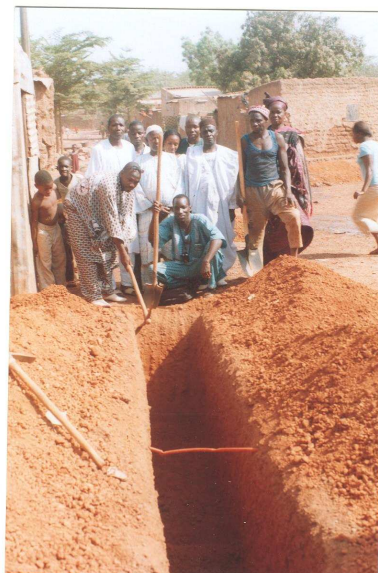

La tranchée avant l'installation de la canalisation

## Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées ont, tout d'abord, été d'ordre administratif. Avant d'obtenir l'autorisation de commencer les travaux, il faut que les services de l'Etat et la Commune donnent leur accord écrit. Energie du Mali, seule entreprise autorisée par l'Etat malien, exige un règlement d'avance et en espèces.

Par ailleurs, nous avons dû convaincre l'équipe dirigeante de l'ASACO du bienfondé de permettre à la population, et notamment aux jeunes de la commune, de travailler sur le chantier. Il leur semblait plus facile de faire intervenir des entreprises de leur connaissance et de donner la facture à HORIZON 54 pour règlement. Nous avons négocié pendant plusieurs jours avec l'aide de notre correspondant malien avant d'obtenir leur accord.

Egalement, ils ont tardé à faire une demande de subvention à la mairie convaincus qu'ils n'obtiendraient pas satisfaction.

## Impact

En Février 2010 nous avons constaté une plus grande fréquentation du CSCOM. Les femmes sont plus en confiance. La cour et les locaux sont un peu mieux entretenus. Les jeunes de l'Association des Jeunes Musulmans du quartier continuent le nettoyage régulier, chaque mois, de la cour et des abords. L'eau coule à flot. Les habitants du quartier peuvent venir dans la cour et se servir de l'eau contre une petite participation financière et éviter de faire 2 ou 3 km pour remplir leurs seaux.

## **Apport du projet en matière d'échanges interculturels**

Le travail du groupe a eu un impact important sur la population du quartier, sur les usagers du CSCOM et le personnel. Ils ont suivi avec intérêt et interrogation l'avancée du chantier. Le travail en commun, le partage et le plaisir de faire ensemble une action de solidarité destinée à toute la population a motivé les jeunes très engagés dans le projet. Des échanges de connaissances entre les "chefs de chantier" lorrain : Américo MARTINS et malien : Lanséni SIDIBE ont généré des discussions sur la façon de fabriquer les parpaings, de faire le ciment, etc..

## **Autonomisation de l'action**

HORIZON 54 souhaite avoir créé une dynamique et avoir motivé les responsables de l'ASACO à formuler leurs projets et, par l'exemple, leur avoir donné les moyens de les réaliser. Nous resterons à l'écoute de l'équipe. Les correspondants de l'association au Mali rencontreront régulièrement le président et les membres de son conseil d'administration. Les jeunes de l'association des jeunes musulmans du quartier souhaitent s'investir dans d'autres projets.

## **Etapas ultérieures**

HORIZON 54 continuera le soutien du centre. Il reste à réaliser une partie de la plomberie et la réfection des peintures pour un accueil des patients plus agréable. La propreté du centre et des abords est maintenant une priorité. Nous avons rencontré le Maire de la commune et avons convenu de mettre en place des réunions de concertation avec les habitants du quartier et les responsables du CSCOM.



La joie de toute l'équipe du CSCOM à l'arrivée de l'eau, devant le mur de clôture terminé
